

LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS N° 23/2024 | **Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública**
Administración Nacional de Educación Pública

COMUNICADO N° 06
05/02/2025


Pregunta 13:

Liceo Cerro Chato:

De acuerdo con los planos de Sanitaria recibidos en enmienda 9 notamos que existe una línea de desagüe que pasa por el sector en el que se ubicaría el módulo, quedando por debajo de éste. Solicitamos por favor aclarar si esto lo resolvemos con una cámara que puede quedar anterior al módulo, o hay que desviar el desagüe de esa línea, eliminando el tramo que quedaría enterrado debajo del módulo.

Ver en la imagen a continuación en la cual se indica en color rosa una cámara intermedia que se haría a mitad aprox. del tramo.

La otra opción indicada en color naranja sería, además de la cámara, el desvío por el frente y lateral, requiriendo además la construcción de dos cámaras adicionales.

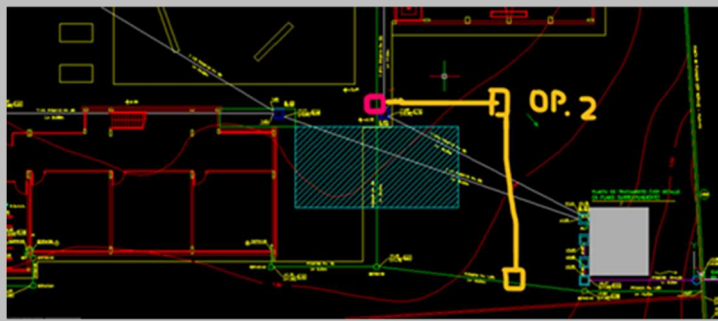

Respuesta 13:

Se soluciona con una cámara registro extra ya que se trata de pluviales.

No se considera necesario desvío del tramo actualmente.
